

日本原燃協の六ヶ所再処理工場の工事進捗状況について

平成 11 年 6 月 29 日

科 学 技 術 庁

日本原燃協の六ヶ所再処理工場について、平成 11 年 5 月 31 日現在の工事進捗状況について、同社より、別添のとおり報告があった。

別添によれば、施設全体の進捗率は、29%であり、うち、再処理本体は、18%、使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設は、98%となっている。

件 名		工 期	工事区分	進捗率 (%)	
				今 月	累計(約)
再 処 理 施 設	使用済燃料の 受入れ及び 貯蔵に必要な 施設	H 5 . 4 . 2 8 [再処理施設の着工]	基 礎	0 . 0	1 0 0
		～	建 物	0 . 0	1 0 0
		H 1 1 . 1 0 [再処理事業の開始]	機器設備	0 . 0	9 7
		総 合		0 . 0	<u>9 8</u>
	再処理設備 本体等に係わ る施設	H 5 . 4 . 2 8 [再処理施設の着工]	基 礎	0 . 0	6 6
		～	建 物	2 . 3	2 4
		H 1 7 . 7 [再処理施設の竣工]	機器設備	1 . 8	1 3
		総 合		2 . 0	<u>1 8</u>
	再処理施設総合			1 . 8	<u>2 9</u>

(平成 11 年 5 月 31 日現在)

再処理施設の工事状況について

(平成 1 1 年 5 月分)

日本原燃株式会社

再処理施設建設工事状況


(平成11年5月31日現在)

件 名		工 期	工事区分	進捗率（％）	
				今月	累計 （約）
再 処 理 施 設	使用済燃料の受入れ 及び貯蔵に必要な施設	H5.4.28 〔再処理 施設の 着工〕 ～ H11.10 〔再処理 事業の 開始〕	基 礎	0.0	100
			建 物	0.0	100
			機器設備	0.0	97
		総 合		0.0	98
	再処理設備本体等 に係わる施設	H5.4.28 〔再処理 施設の 着工〕 ～ H17.7 〔再処理 施設の 竣工〕	基 礎	0.0	66
			建 物	2.3	24
			機器設備	1.8	13
		総 合		2.0	18
	再処理施設総合			1.8	29



再処理施設工事状況

(平成11年5月26日 撮影)

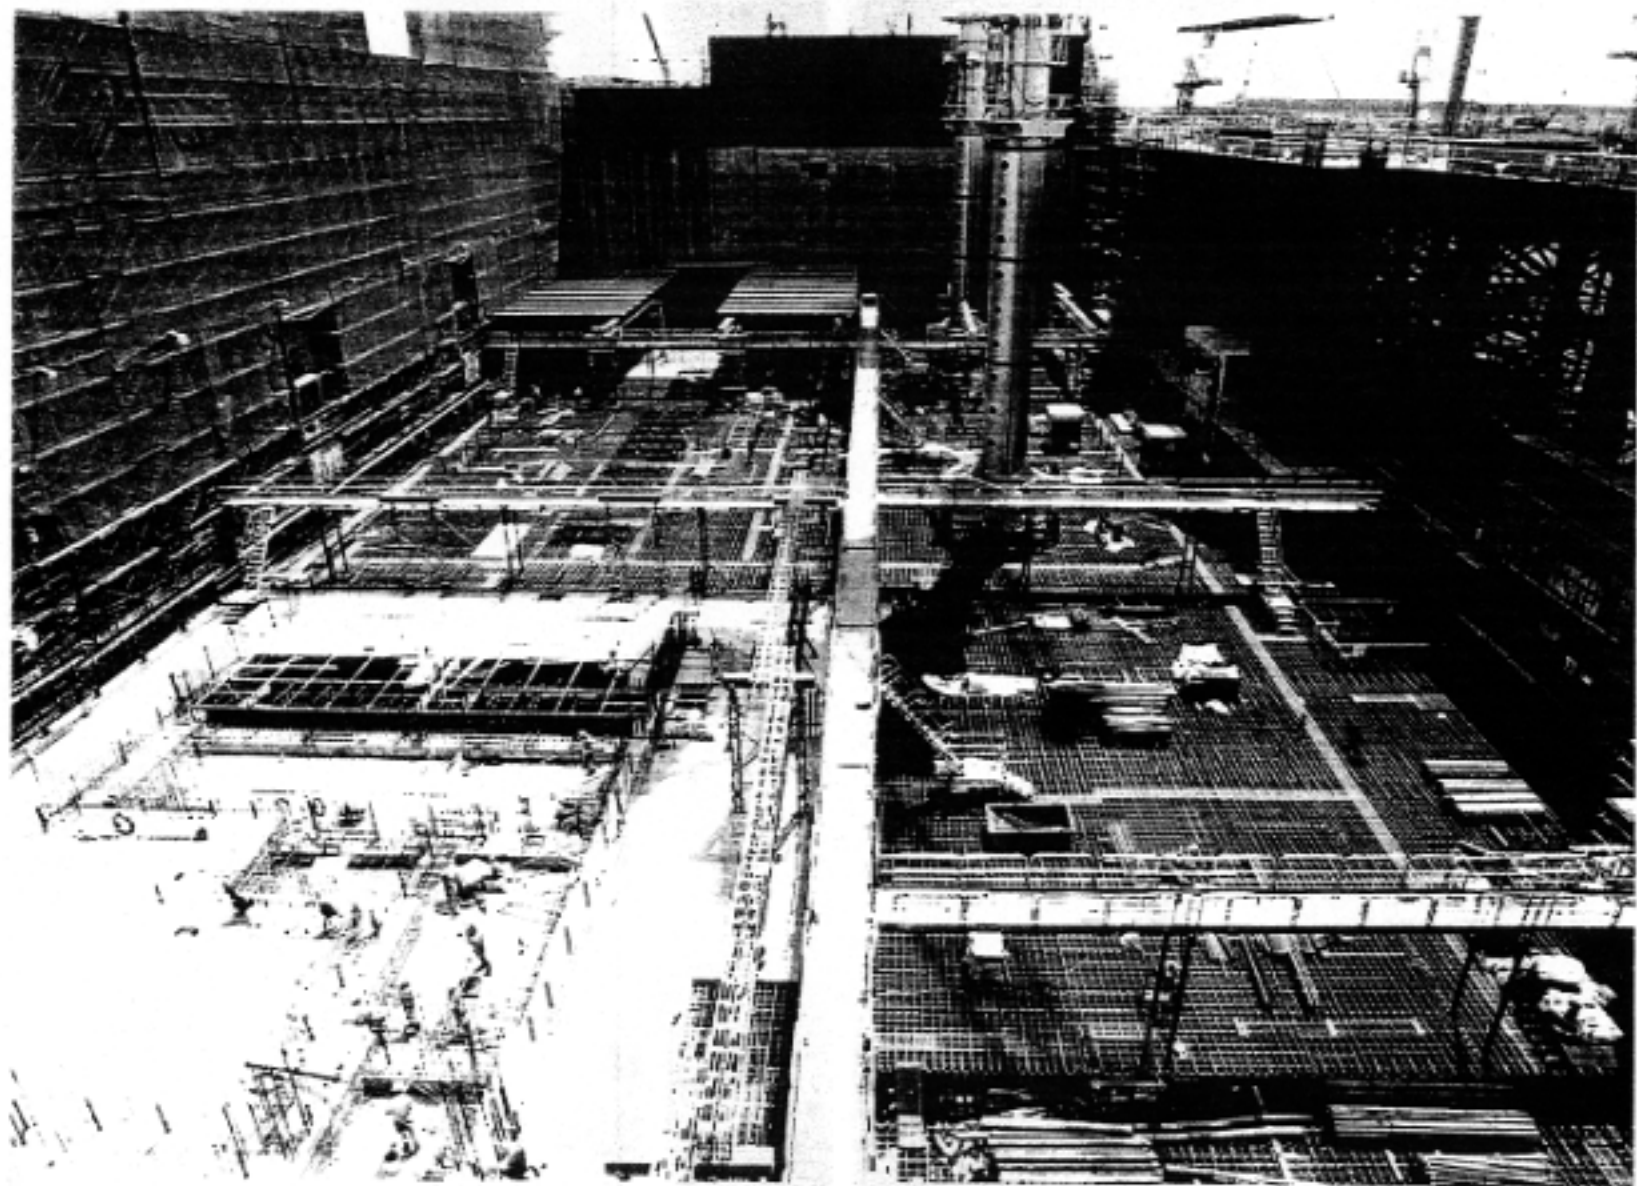

分析建屋建設工事状況

(平成11年5月26日 撮影)



ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋建設工事状況

(平成11年5月26日 撮影)

工事進捗率（想定）

年 月	10 年 度 末	11 年 度 末	12 年 度 末	13 年 度 末	14 年 度 末	17 年 7 月 （竣工時）
進 捗 率	13 %	30 %	60 %	80 %	90 %	100 %

（注 1）上記進捗率は、再処理設備本体等に係わる施設を対象とした工事進捗率。10 年度末の 13% は実績値。

（注 2）上記進捗率と実績進捗率とは、工事の段取り調整や天候などによって、±数%の相違は起こりうる。
