

日本原燃(株)の六ヶ所再処理工場の工事進捗状況について

平成11年11月19日

科 学 技 術 庁

日本原燃(株)の六ヶ所再処理工場について、平成11年10月31日現在の工事進捗状況について、同社より、別添のとおり報告があった。

別添によれば、施設全体の進捗率は、37% (9月末:35%)であり、うち、再処理設備本体施設は28% (9月末:25%)、使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設は99% (9月末:99%)となっている。

<平成11年10月31日現在>

件 名		工 期	工事区分	進捗率(%)	
				今月	累計(約)
再 処 理 施 設	使用済み燃料 の受入れ及び 貯蔵に必要な 施設	H5. 4. 28 [再処理施設の着工]	基 礎	0. 0	100
		～	建 物	0. 0	100
		H11. 12 [再処理事業の開始]	機器設備	0. 2	99
		総 合		0. 1	<u>99</u> ^(注1)
	再処理設備本 体に係わる施 設	H5. 4. 28 [再処理施設の着工]	基 礎	0. 8	71
		～	建 物	3. 0	37
		H17. 7 [再処理施設の竣工]	機器設備	1. 9	22
		総 合		2. 2	<u>28</u> ^(注2)
	再処理施設総合			1. 9	<u>37</u>

(注1) 使用前検査に合格し、再処理事業の開始をもって100%とする。

(注2) 日本原燃(株)より、本進捗率に対応する年度末毎の想定進捗率を公表済み。

再処理施設の工事状況について

(平成 1 1 年 1 0 月分)

日本原燃株式会社

再処理施設建設工事状況

(平成11年10月31日現在)


件 名		工 期	工事区分	進捗率（％）	
				今月	累計 （約）
再 処 理 施 設	使用済燃料の受入れ 及び貯蔵に必要な施設	H5.4.28 〔再処理 施設の 着工〕 ～ H11.12 〔再処理 事業の 開始〕	基 礎	0.0	100
			建 物	0.0	100
			機器設備	0.2	99
		総 合		0.1	99*
	再処理設備本体等に 係わる施設	H5.4.28 〔再処理 施設の 着工〕 ～ H17.7 〔再処理 施設の 竣工〕	基 礎	0.8	71
			建 物	3.0	37
			機器設備	1.9	22
		総 合		2.2	28
	再処理施設総合			1.9	37

*: 使用前検査合格証の交付を受け、再処理事業の開始をもって100%とする。



再処理施設工事状況

(平成11年10月27日 撮影)

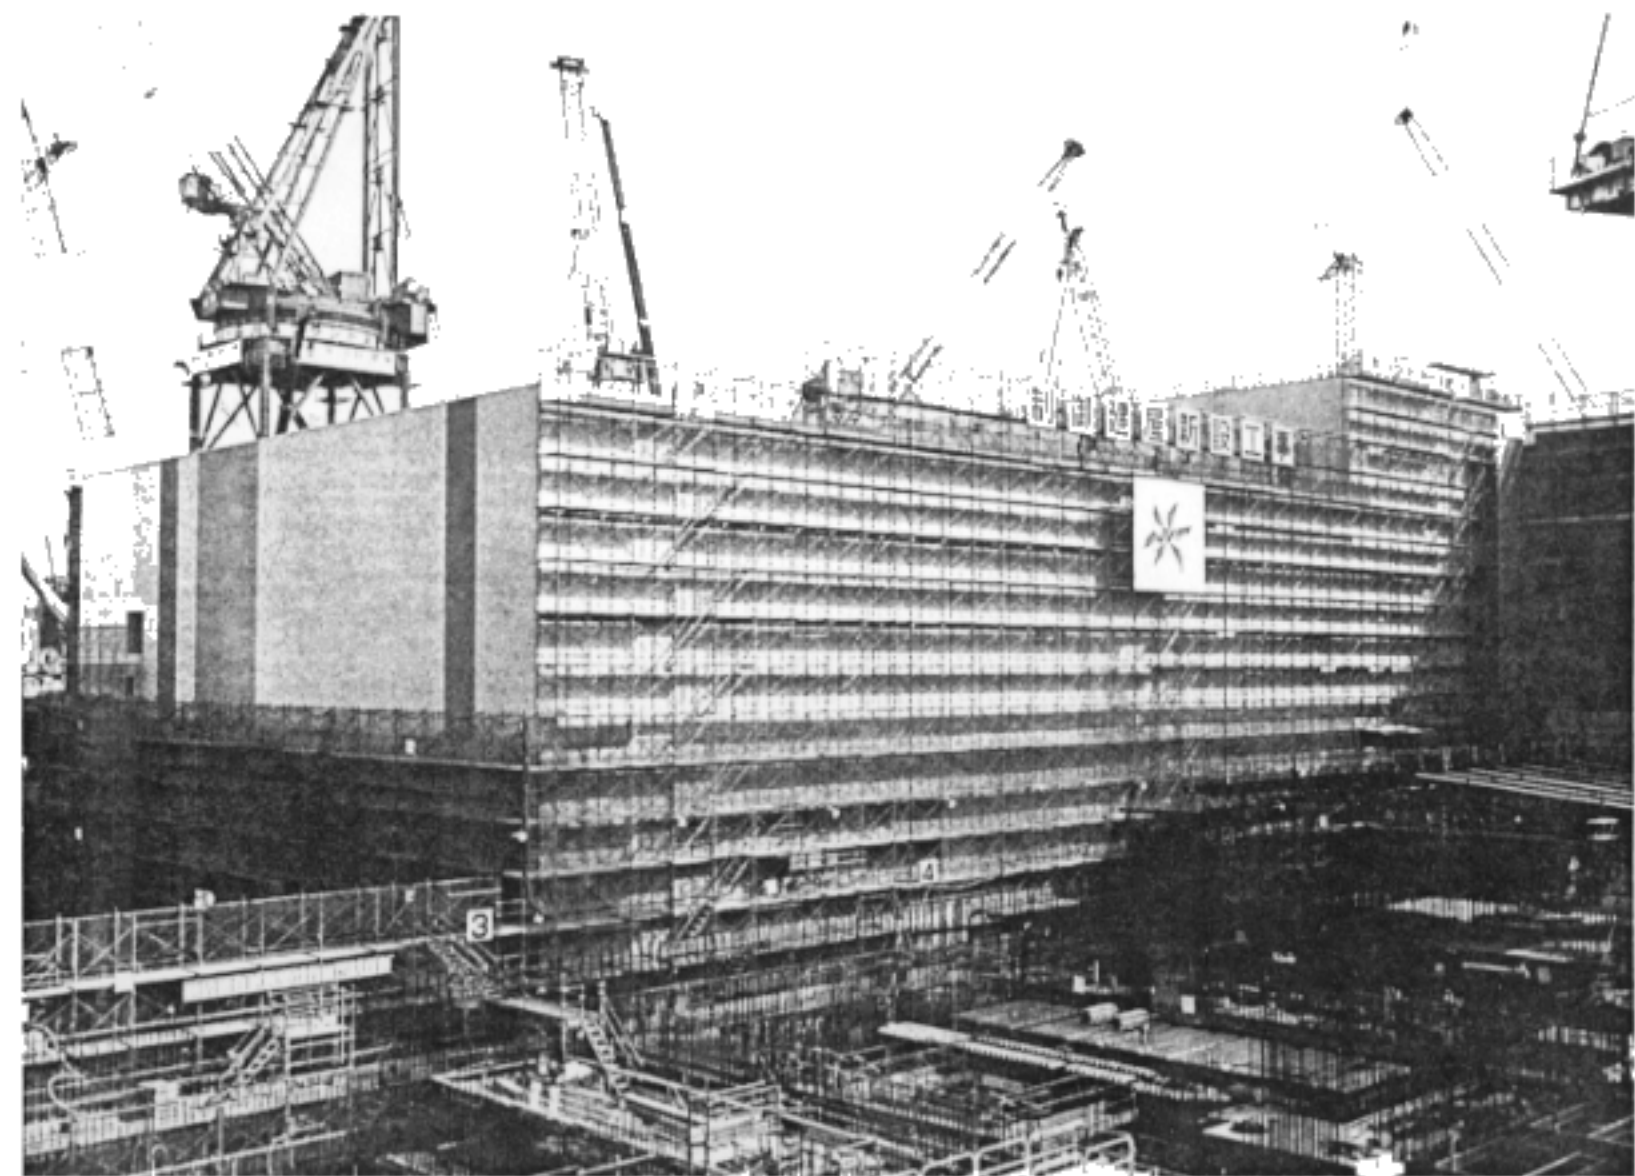

制御建屋建設工事状況


(平成11年10月27日 撮影)



前処理建屋建設工事状況

【地上3階（+14.0m）床コンクリート均し工事状況（左官工事）】

（平成11年10月27日 撮影）

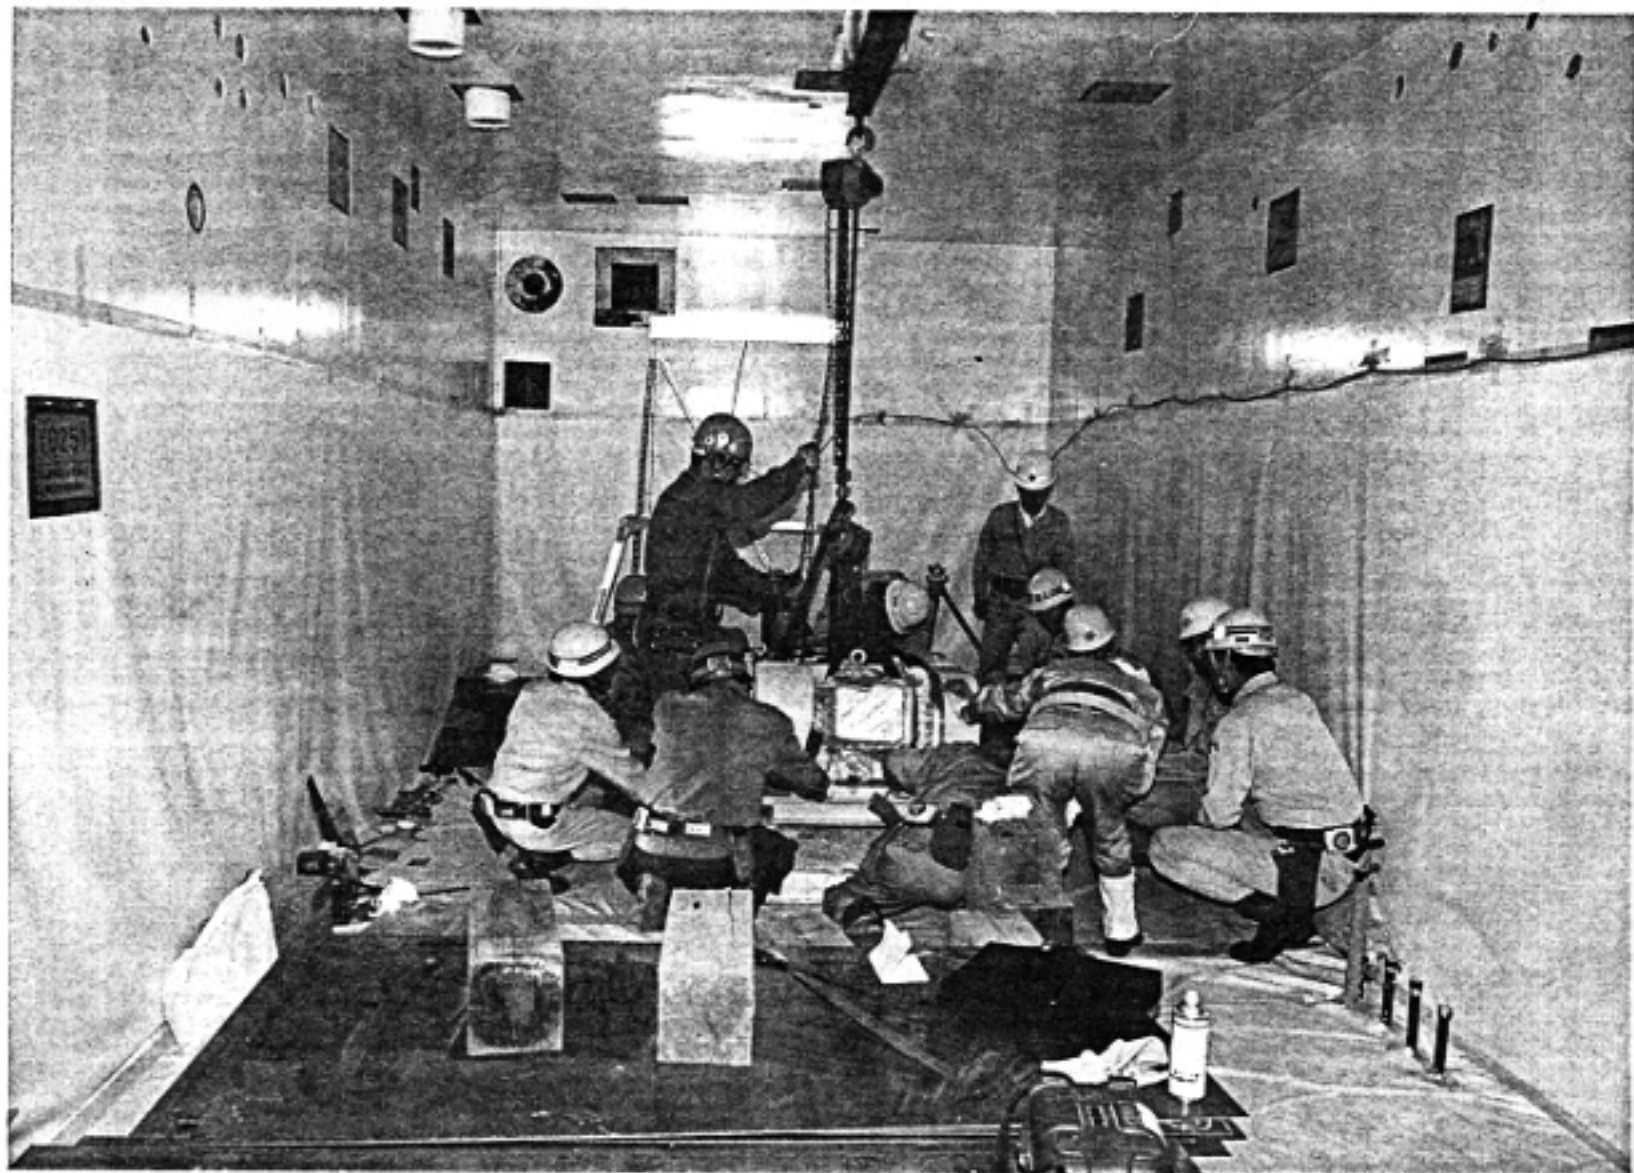

前処理建屋建設工事状況

【地下3階（-11.0m）せん断処理・溶解廃ガス処理第2排風機据付状況】

（平成11年10月27日 撮影）

再処理設備本体等に係わる施設を対象とした 工事進捗率（想定）

年 月	10 年 度 末	11 年 度 末	12 年 度 末	13 年 度 末	14 年 度 末	17 年 7 月 （竣工時）
進 捗 率	13 %	30 %	60 %	80 %	90 %	100 %

（注 1）10 年度末の 13% は実績値。

（注 2）上記進捗率と実績進捗率とは、工事の段取り調整や天候などによって、±数%の相違は起こりうる。
