

日本原燃（株）の六ヶ所再処理工場の工事進捗状況について

平成12年2月29日

科学技術庁

日本原燃（株）の六ヶ所再処理工場について、平成12年1月31日現在の工事進捗状況について、同社より別添のとおり報告があった。

別添によれば、再処理設備本体施設の進捗率は33%（昨年12月末：31%）となっている。

<平成12年1月31日現在>

件名	工期	工事区分	進捗率(%)	
			今月	累計(約)
再処理設備本体に係わる施設	H5.4.28 [再処理施設の着工]	基礎	0.1	72
	~	建物	1.2	44
	H17.7 [再処理施設の竣工]	機器設備	2.4	28
	総合		2.1	33*

(\* )日本原燃(株)より、本進捗率に対応する年度末毎の想定進捗率を公表済み。

# 再処理施設の工事状況について

(平成12年1月分)

日本原燃株式会社

# 再処理施設建設工事状況

(平成12年1月31日現在)


件名	工期	工事区分	進捗率(%)	
			今月	累計(約)
再処理設備本体等に係る施設	H5.4.28 [再処理施設の着工] ~ H17.7 [再処理施設の竣工]	基礎	0.1	72
		建物	1.2	44
		機器設備	2.4	28
	総合	2.1	33	

なお、平成12年1月度の延べ作業員数は、81,896人であり、うち青森県内の作業員数割合は約61%である。



## 再処理施設工事状況

(平成12年1月31日 撮影)

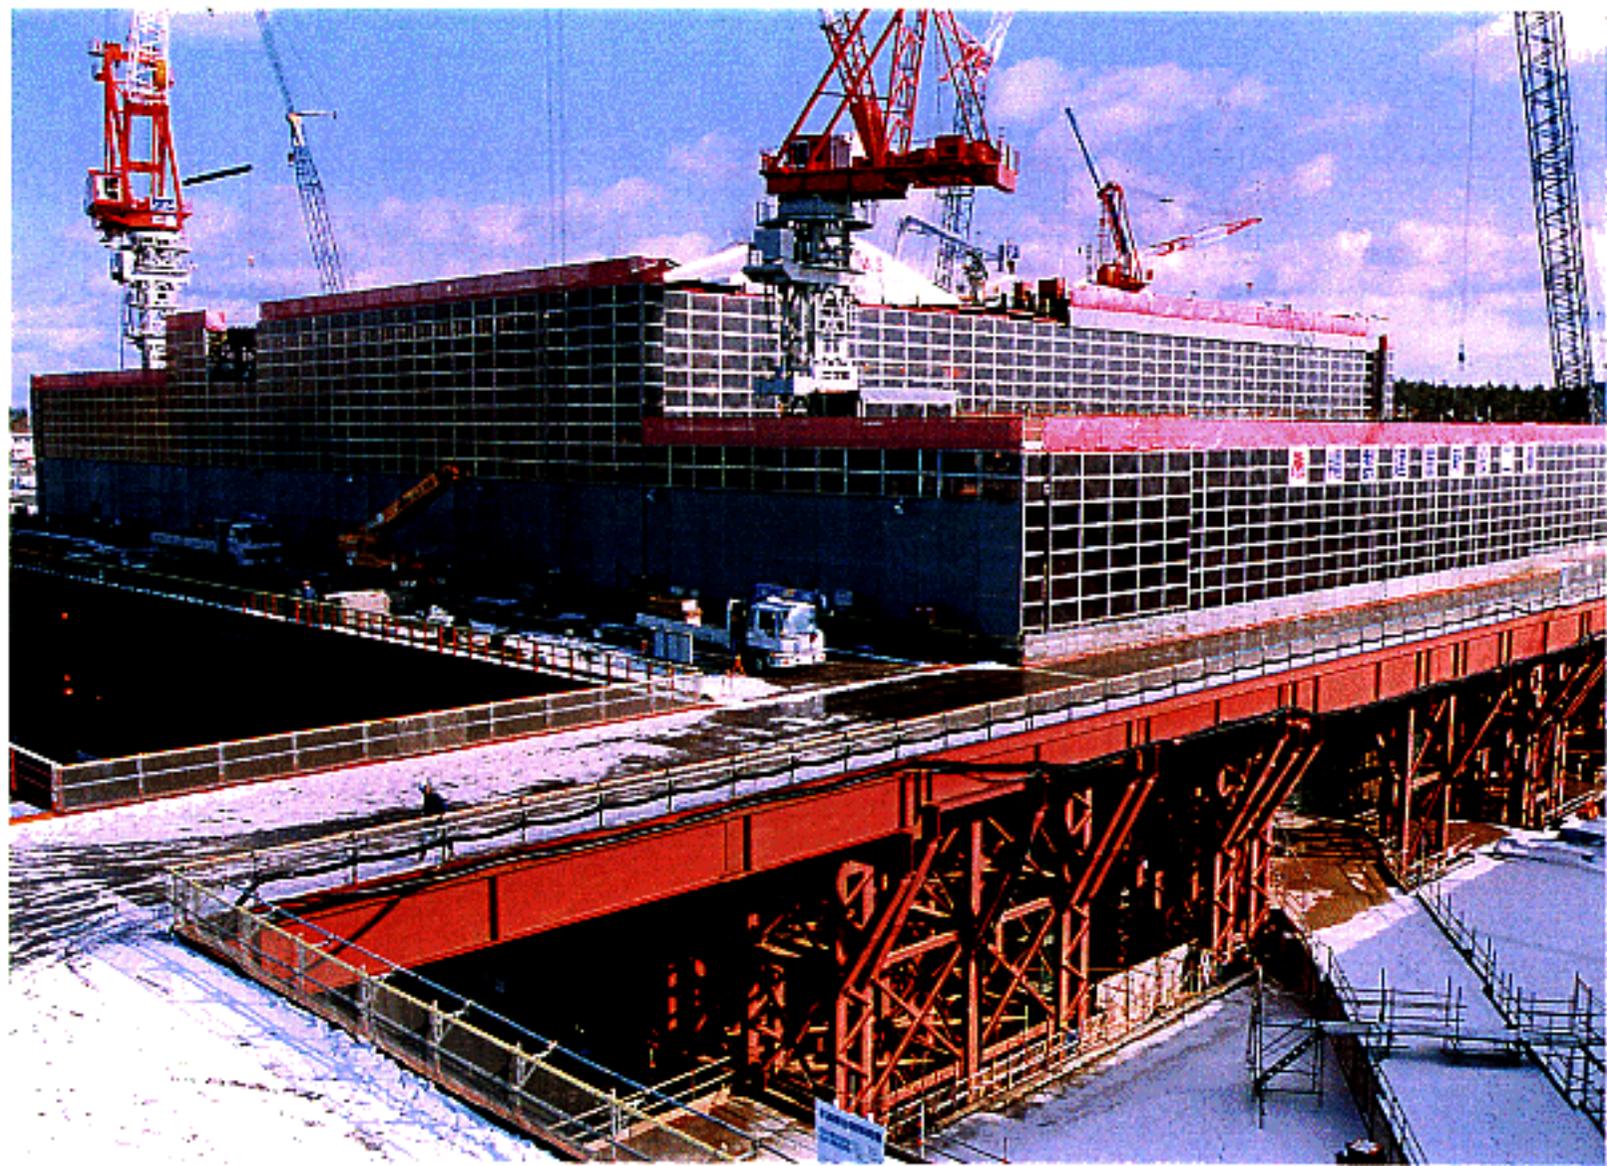

## 精製建屋建設工事状況

(平成12年1月31日 撮影)



## 制御建屋建設工事状況

【中央制御室】

(平成12年1月31日 撮影)



## 分離建屋建設工事状況

【地上1階 配筋工事作業状況】

(平成12年1月31日 撮影)

## 再処理設備本体等に係わる施設を対象とした 工事進捗率（想定）

年 月	10 年度末	11 年度末	12 年度末	13 年度末	14 年度末	17 年 7 月 (竣工時)
進捗率	13 %	30 %	60 %	80 %	90 %	100 %

（注 1）10 年度末の 13% は実績値。

（注 2）上記進捗率と実績進捗率とは、工事の段取り調整や天候などによって、±数%の相違は起こりうる。
