

日本原燃（株）の六ヶ所再処理工場の工事進捗状況について

平成12年7月25日

科学技術庁

日本原燃（株）の六ヶ所再処理工場について、平成12年6月30日現在の工事進捗状況について、同社より別添のとおり報告があった。

別添によれば、再処理設備本体施設の進捗率は44%（5月末：42%）となっている。

<平成12年6月30日現在>

件 名	工 期	工事区分	進捗率(%)	
			今月	累計(約)
再 処 理 設 備 本 体 に 係 わ る 施 設	H5.4.28 [再処理施設の着工]	基 礎	0.5	74
	～	建 物	2.8	56
	H17.7 [再処理施設の竣工]	機器設備	2.1	39
	総 合		2.3	44*

(*)日本原燃(株)より、本進捗率に対応する年度末毎の想定進捗率を公表済み。

再処理施設の工事状況について

(平成12年6月分)


日本原燃株式会社

再処理施設建設工事状況

(平成 12 年 6 月 30 日現在)


件 名	工 期	工事区分	進捗率 (%)	
			今月	累計 (約)
再処理設備本体等に係る施設	H5.4.28 [再処理施設の着工] ~ H17.7 [再処理施設の竣工]	基 礎	0.5	74
		建 物	2.8	56
		機器設備	2.1	39
	総 合		2.3	44

なお、平成 12 年 6 月度の延べ作業員数は、164,246 人であり、うち青森県内の作業員数割合は約 60% である。

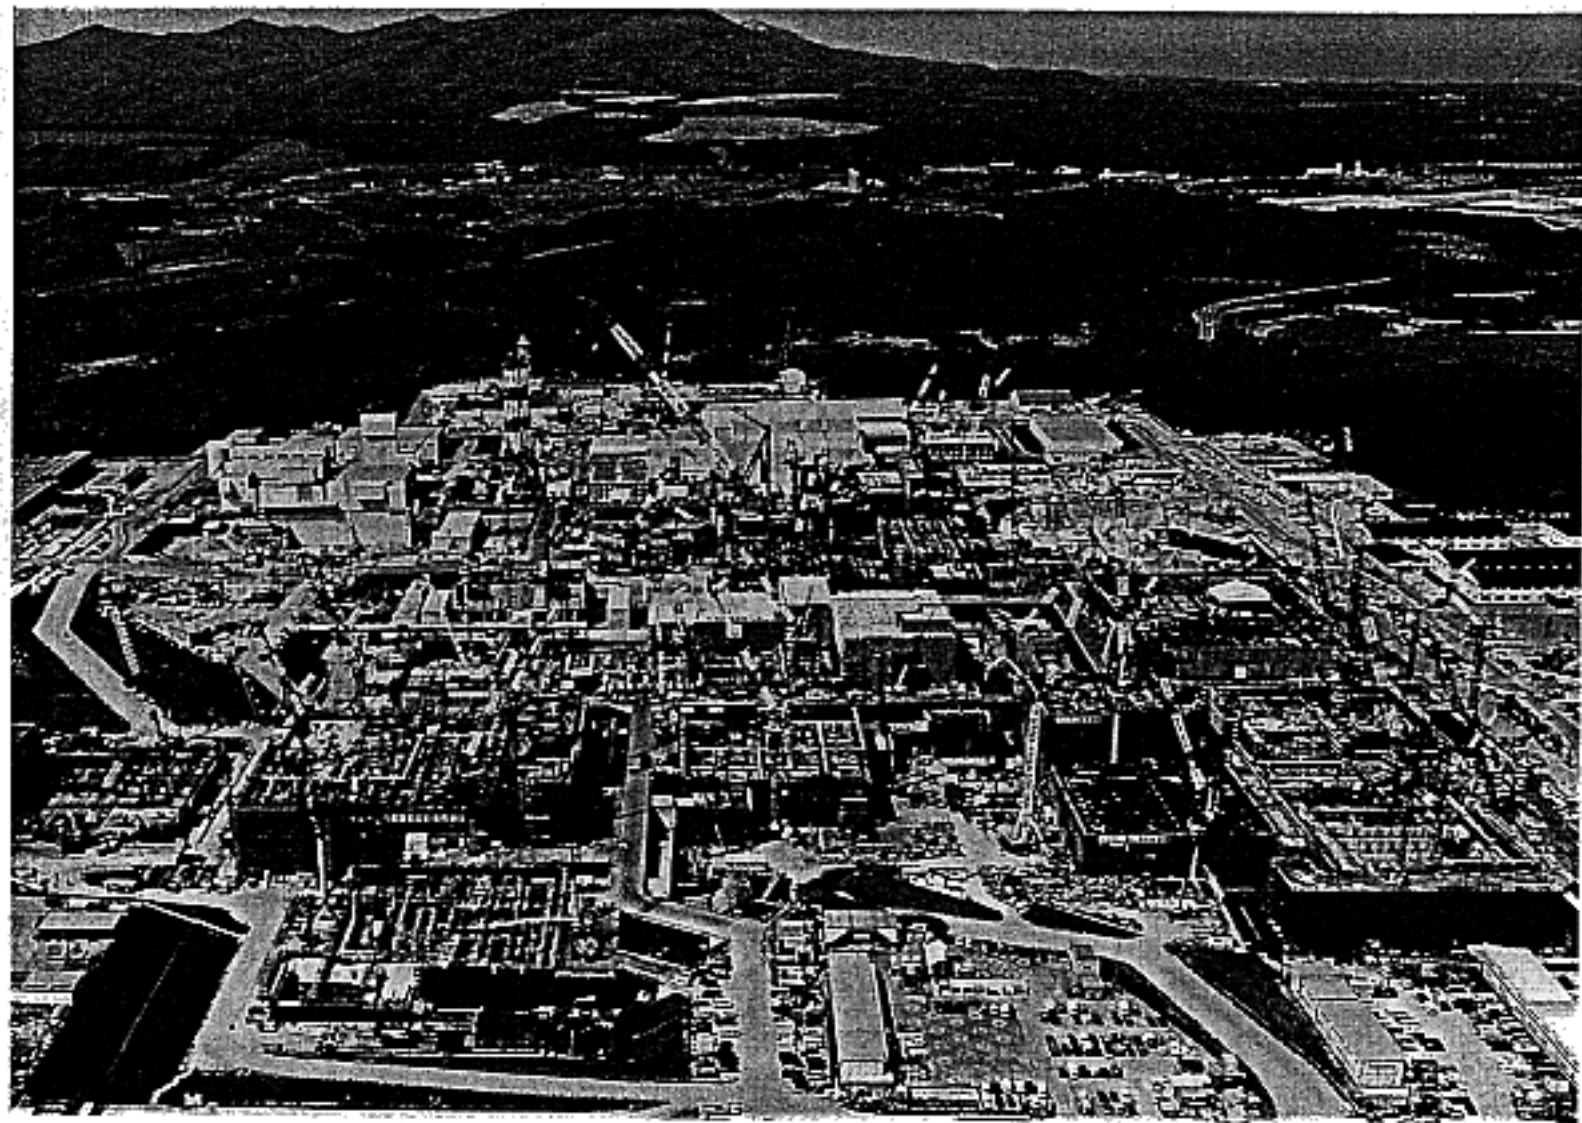


再処理施設工事状況

(平成12年6月 5日 撮影)

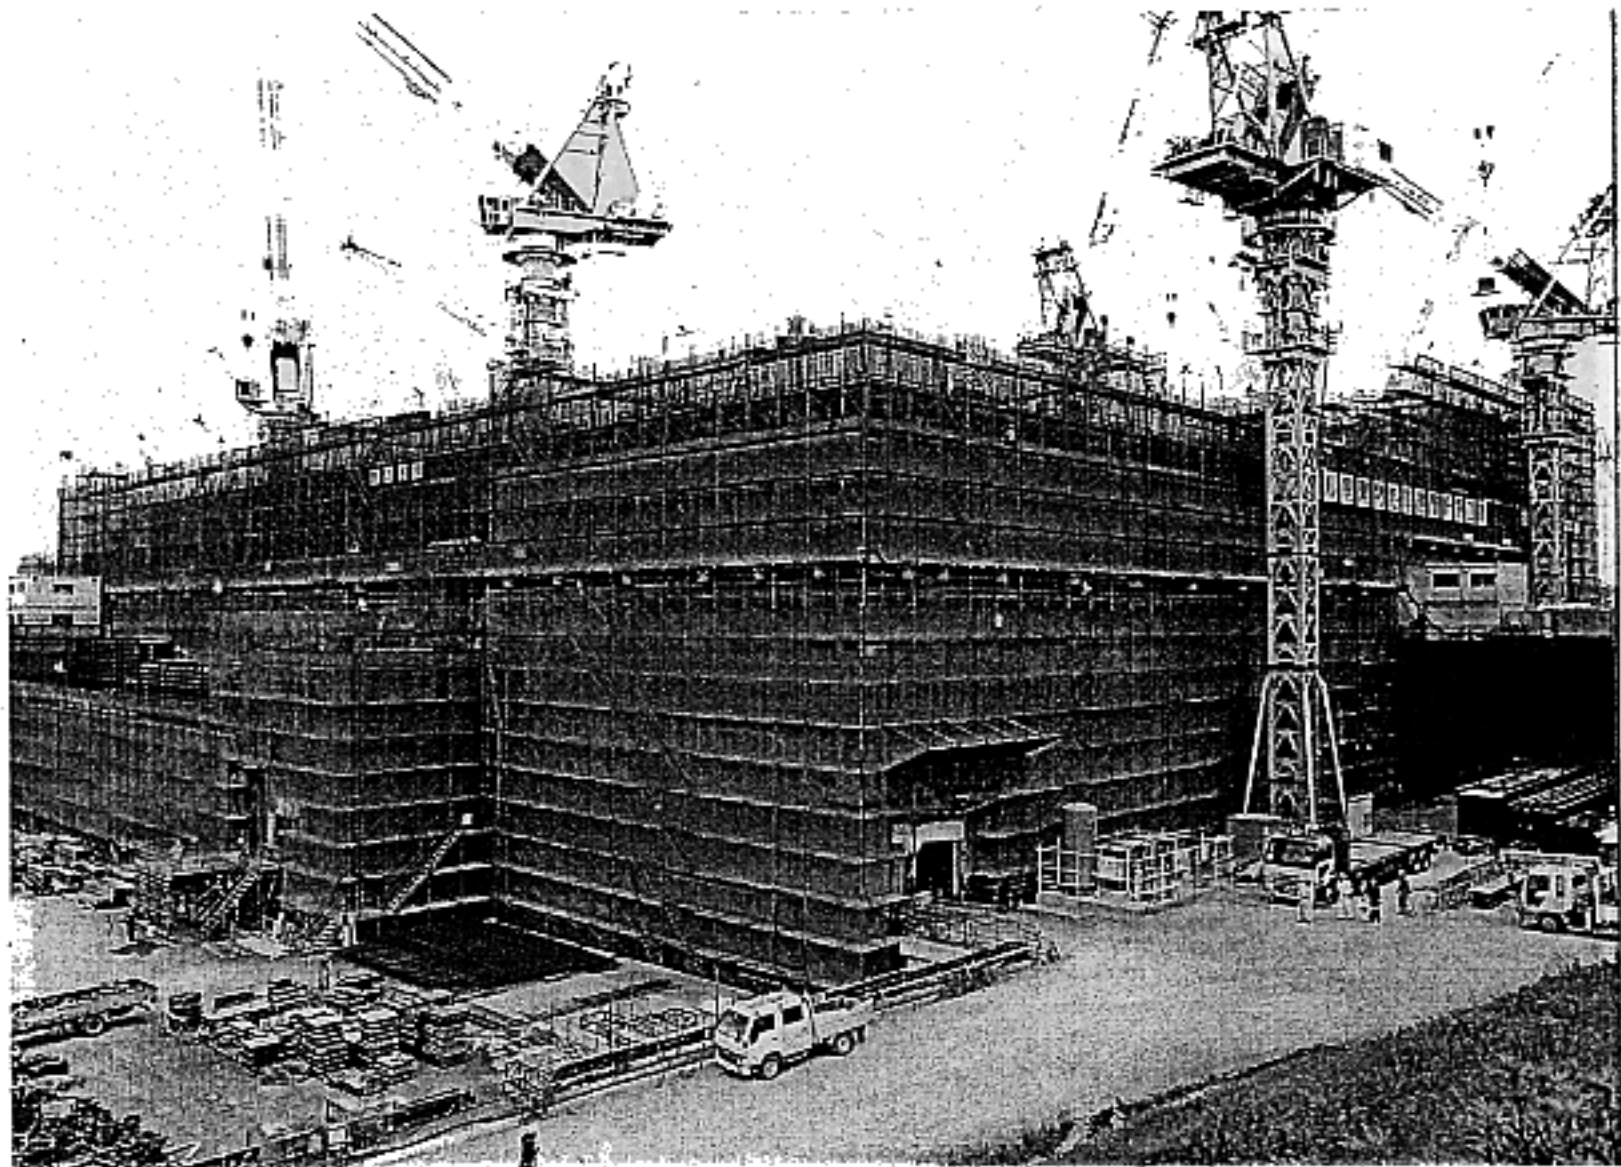

低レベル廃棄物処理建屋工事状況


(平成12年6月27日 撮影)

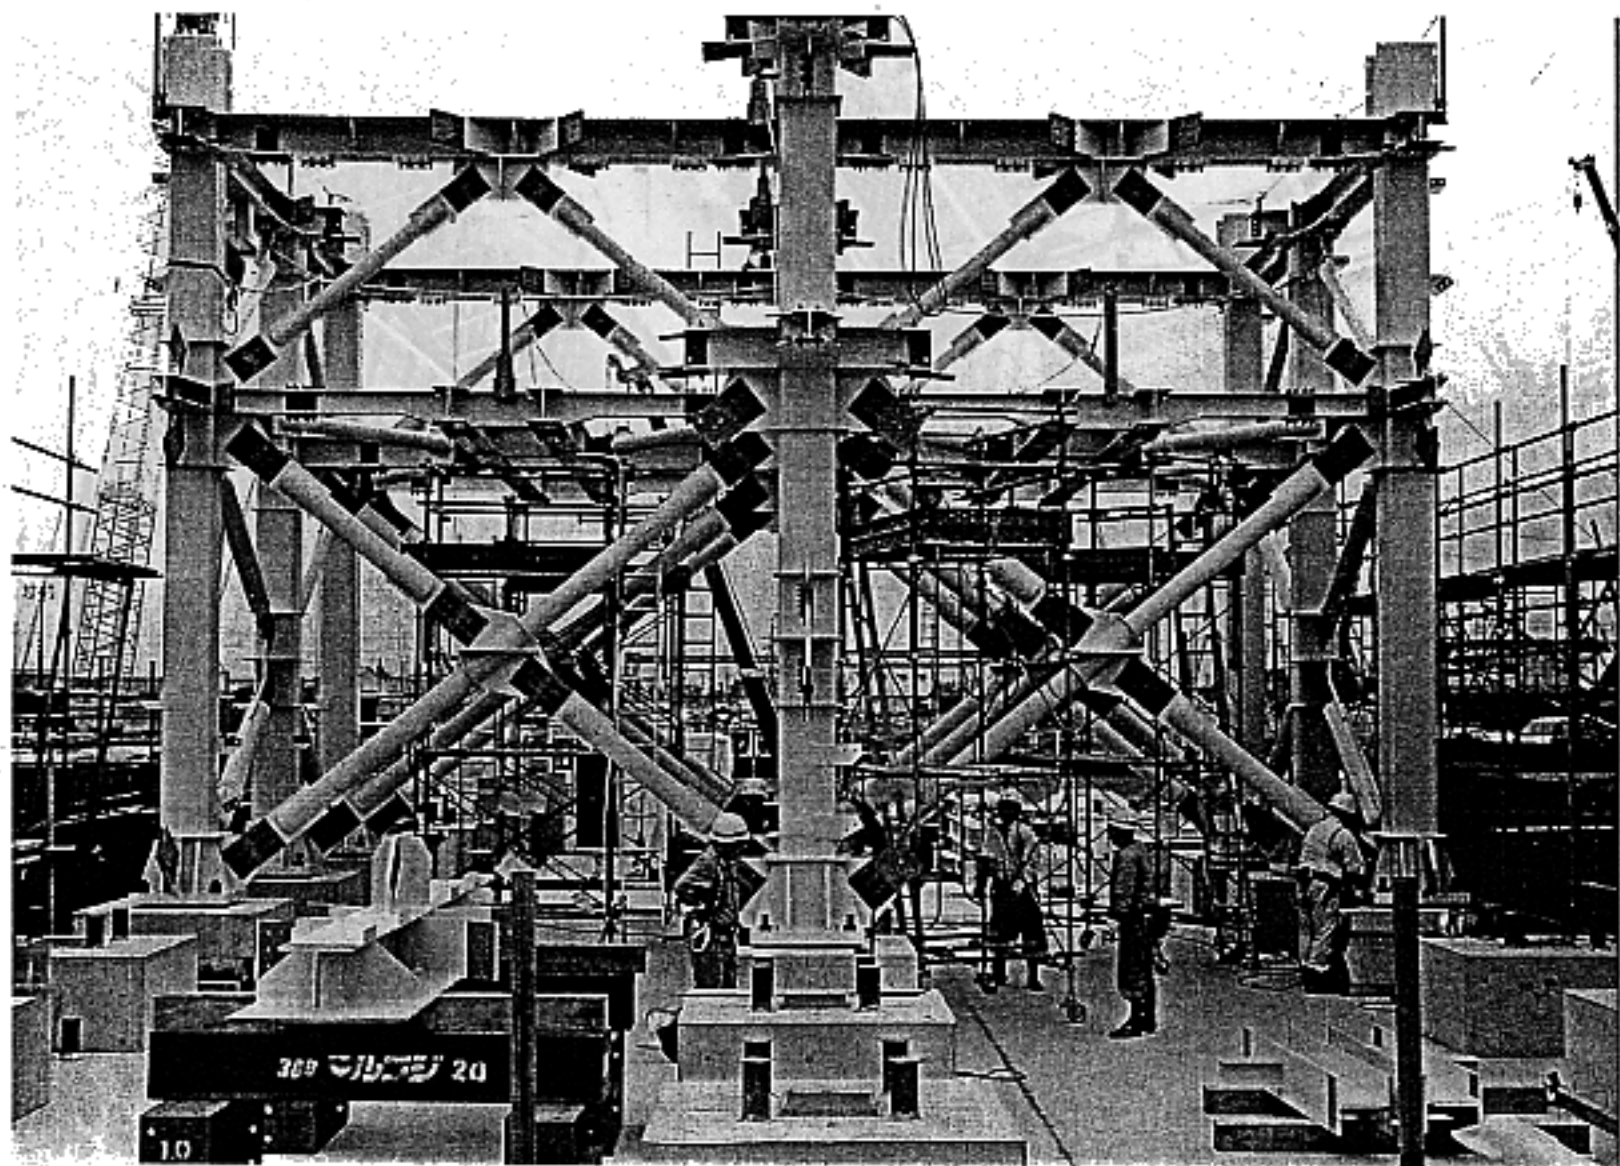

冷却水設備（安全冷却水系）工事状況

【冷却塔据付工事状況】

（平成12年6月27日 撮影）

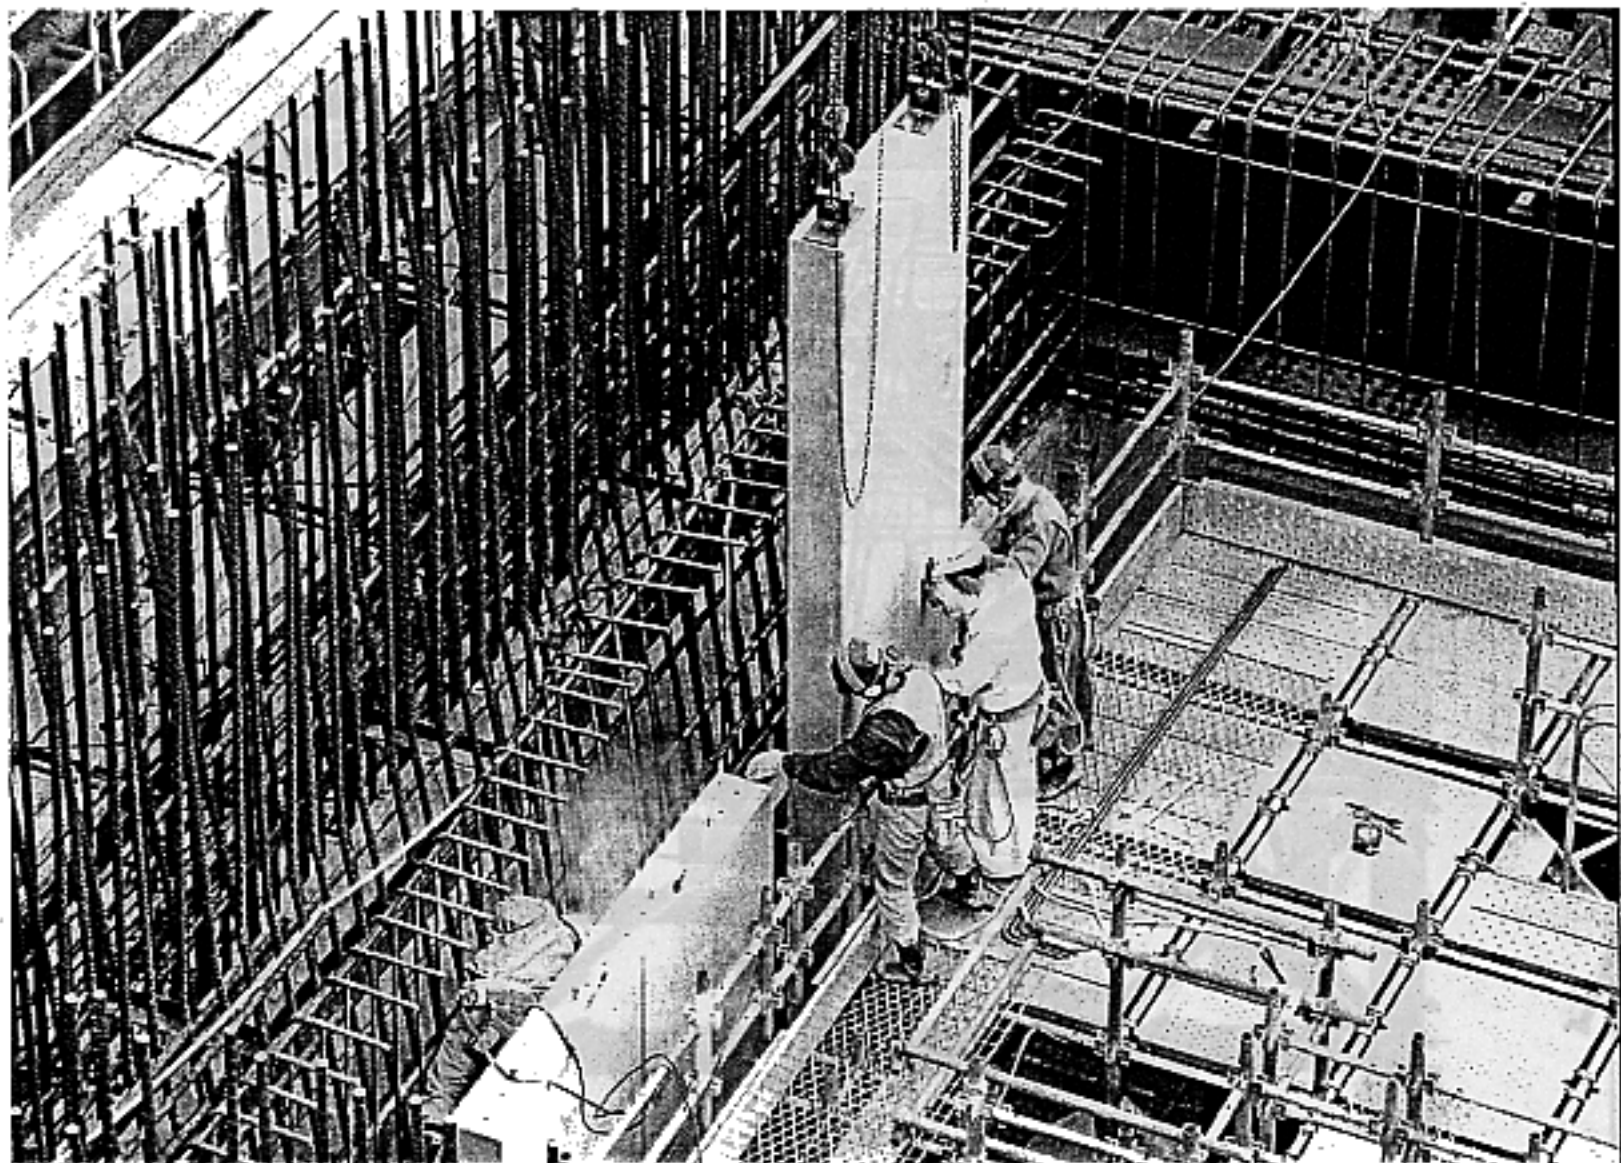


ウラン酸化物貯蔵建屋工事状況

【コンクリート板据付作業状況】

(平成12年6月27日 撮影)

注) 本作業は、7月4日に実施したものである。

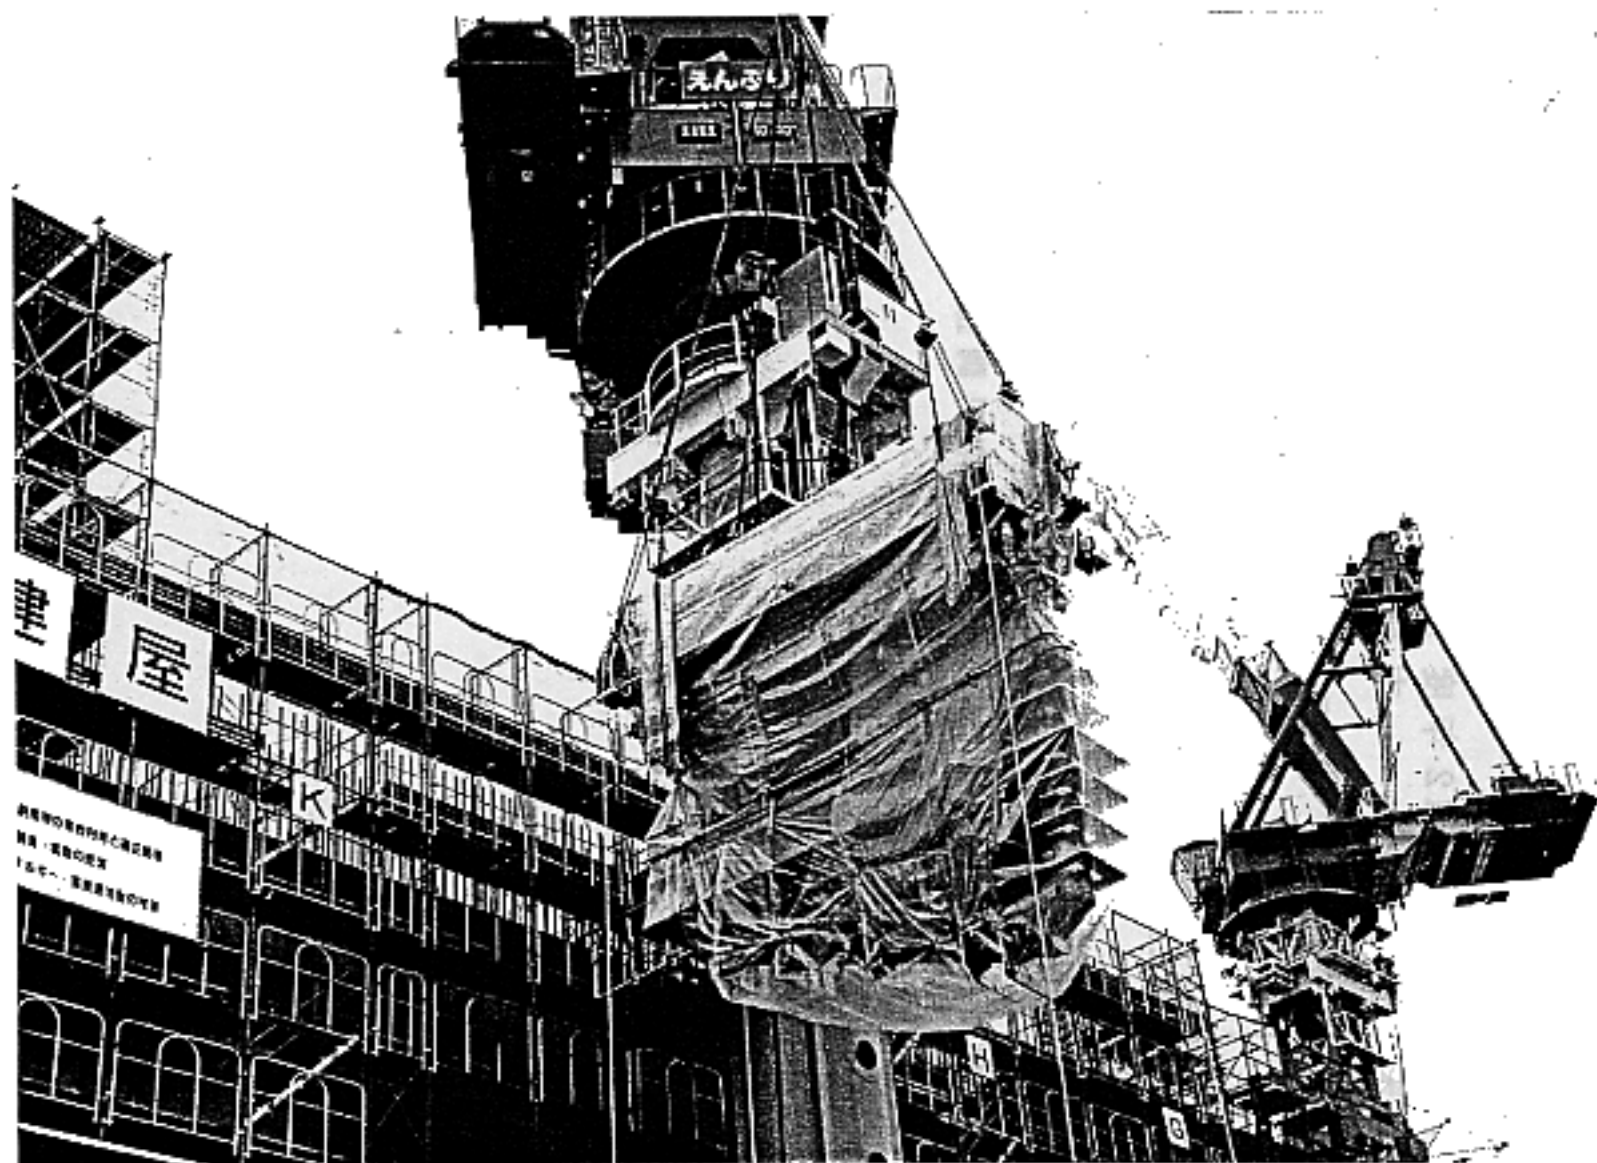

前処理建屋工事状況

【溶解槽搬入作業状況】

(平成12年7月 4日 撮影)

再処理設備本体等に係わる施設を対象とした 工事進捗率（想定）

年 月	10 年度 末	11 年度 末	12 年度 末	13 年度 末	14 年度 末	17 年 7 月 （竣工時）
進捗率	13 %	37 %	60 %	80 %	90 %	100 %

（注 1） 10 年度末及び 11 年度末の進捗率は実績値。

（注 2） 上記進捗率と実績進捗率とは、工事の段取り調整や天候などによっ
て、±数 % の相違は起こりうる。
