

日本原燃（株）の六ヶ所再処理工場の工事進捗状況について

平成12年10月31日
科学技術庁

日本原燃（株）の六ヶ所再処理工場について、平成12年9月30日現在の工事進捗状況について、同社より別添のとおり報告があった。

別添によれば、再処理設備本体施設の進捗率は51%（8月末：49%）となっている。
<平成12年9月30日現在>

件名	工期	工事区分	進捗率（%）	
			今月	累計（約）
再処理設備本体に係わる施設	H5.4.28 [再処理施設の着工]	基礎	0.2	75
		建物	2.9	64
	～ H17.7 [再処理施設の竣工]	機器設備	2.1	46
		総合	2.3	51*

(*）日本原燃（株）より、本進捗率に対応する年度末毎の想定進捗率を公表済み。

再処理施設の工事状況について

(平成12年9月分)

日本原燃株式会社

再処理施設建設工事状況

(平成 12 年 9 月 30 日現在)

件名	工期	工事区分	進捗率 (%)	
			今月	累計 (約)
再処理設備本体等に係る施設	H5.4.28 [再処理施設の着工] ~ H17.7 [再処理施設の竣工]	基礎	0.2	75
		建物	2.9	64
		機器設備	2.1	46
	総合	2.3	51	


なお、平成 12 年 9 月度の延べ作業員数は、174,923 人であり、うち青森県内の作業員数割合は約 57% である。

No. 1




再処理施設工事状況

(平成12年9月27日 撮影)

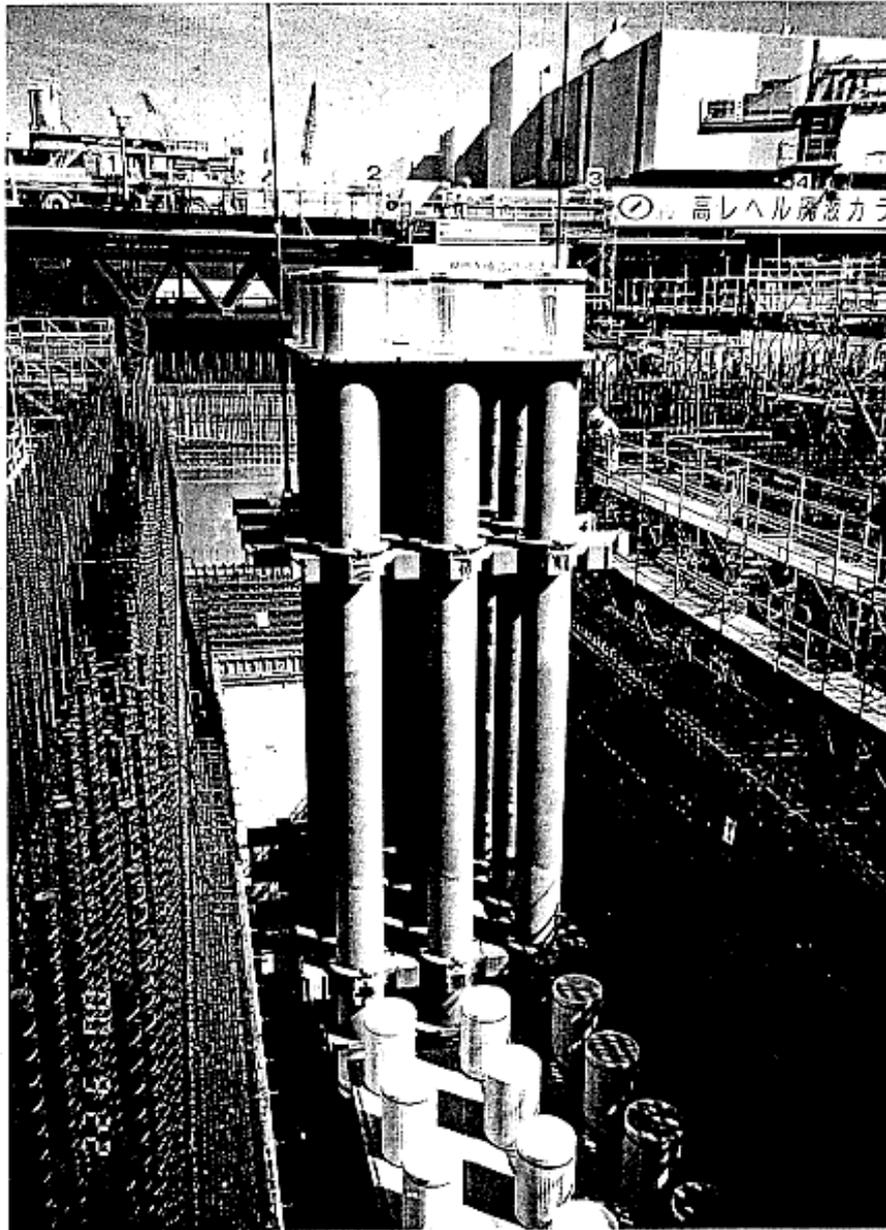

高レベル廃液ガラス固化建屋工事状況

【貯蔵ピット（通風管）搬入作業状況】
（平成12年9月22日 撮影）

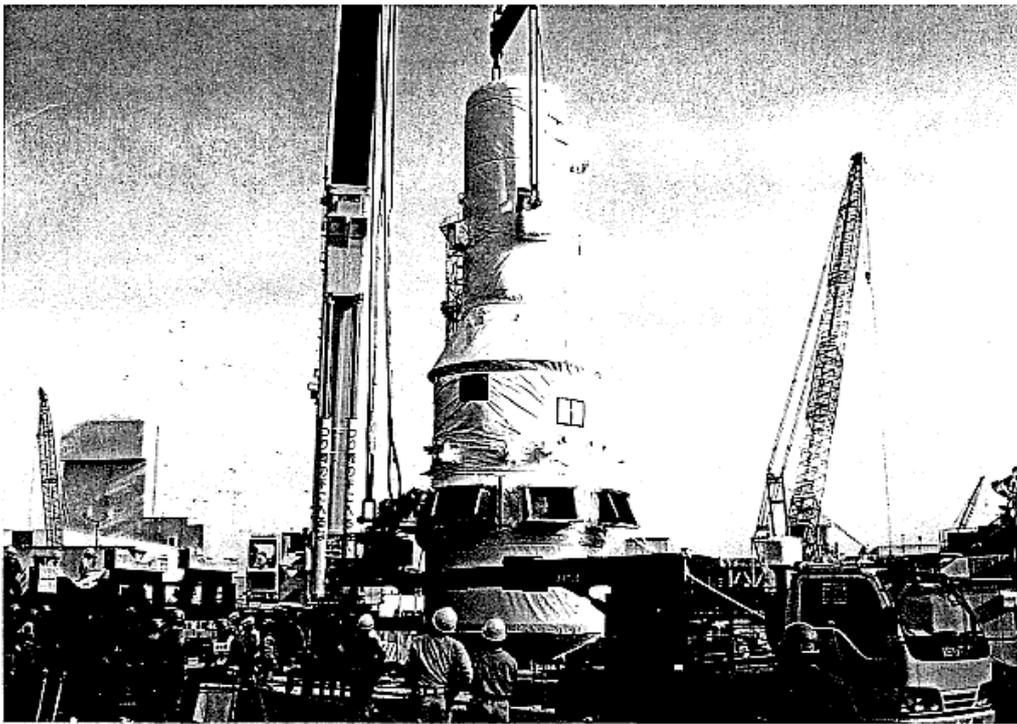


分離建屋工事状況

【高レベル廃液濃縮缶搬入作業状況】

(平成12年9月21日 撮影)

No. 4

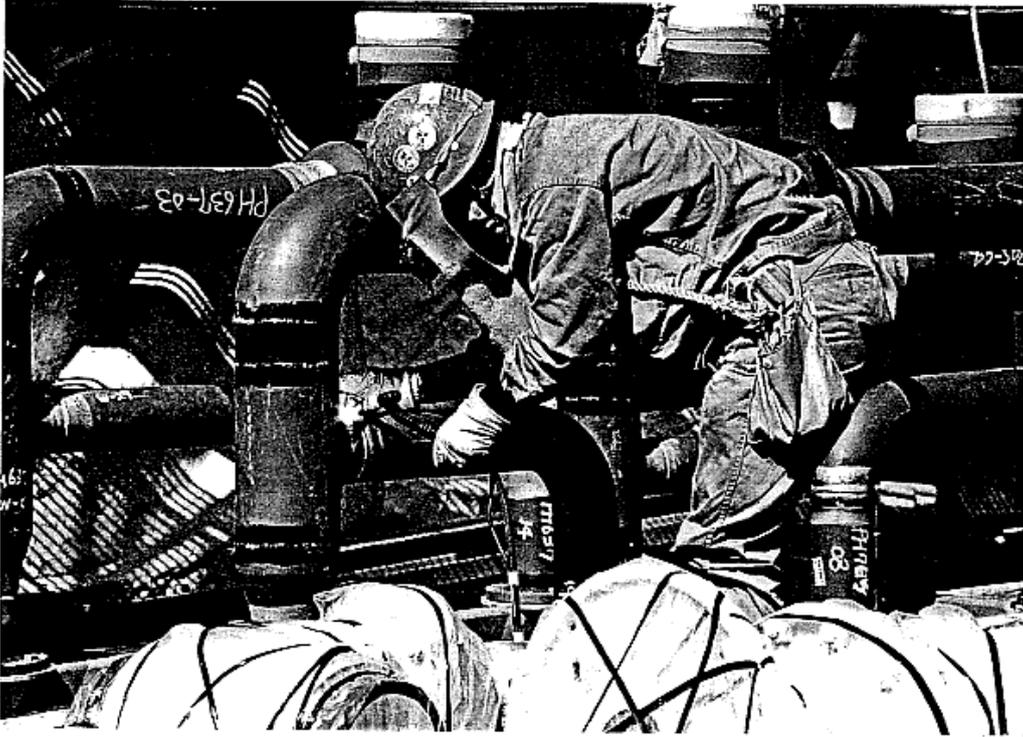

出入管理建屋工事状況

【一般冷却水系配管溶接作業状況】

(平成12年9月27日 撮影)

再処理設備本体等に係わる施設を対象とした
工事進捗率（想定）

年 月	10年度末	11年度末	12年度末	13年度末	14年度末	17年7月 （竣工時）
進捗率	13 %	37 %	60 %	80 %	90 %	100 %

（注1）10年度末及び11年度末の進捗率は実績値。

（注2）上記進捗率と実績進捗率とは、工事の段取り調整や天候などによつて、±数%の相違は起こりうる。
