

日本原燃(株)の六ヶ所再処理工場の工事進捗状況について

平成12年12月 1日
科 学 技 術 庁

日本原燃(株)の六ヶ所再処理工場について、平成12年10月31日現在の工事進捗状況について、同社より別添のとおり報告があった。

別添によれば、再処理設備本体施設の進捗率は54%(9月末:51%)となっている。

<平成12年10月31日現在>

件 名	工 期	工事区分	進捗率(%)	
			今月	累計(約)
再処理設備本体に係わる施設	H5. 4. 28 [再処理施設の着工]	基 礎	0. 3	76
	~	建 物	2. 4	67
	H17. 7 [再処理施設の竣工]	機器設備	2. 8	49
	総 合		2. 5	54*

(*) 日本原燃(株)より、本進捗率に対応する年度末毎の想定進捗率を公表済み。

再処理施設の工事状況について

(平成12年10月分)

日本原燃株式会社

再処理施設建設工事状況

(平成 12 年 10 月 31 日現在)


件 名	工 期	工事区分	進捗率 (%)	
			今月	累計 (約)
再処理設備本体等に係る施設	H5.4.28 [再処理施設の着工] ~ H17.7 [再処理施設の竣工]	基 礎	0.3	76
		建 物	2.4	67
		機器設備	2.8	49
	総 合		2.5	54

なお、平成 12 年 10 月度の延べ作業員数は、180,567 人であり、うち青森県内の作業員数割合は約 57 % である。




再処理施設工事状況

(平成12年10月30日 撮影)

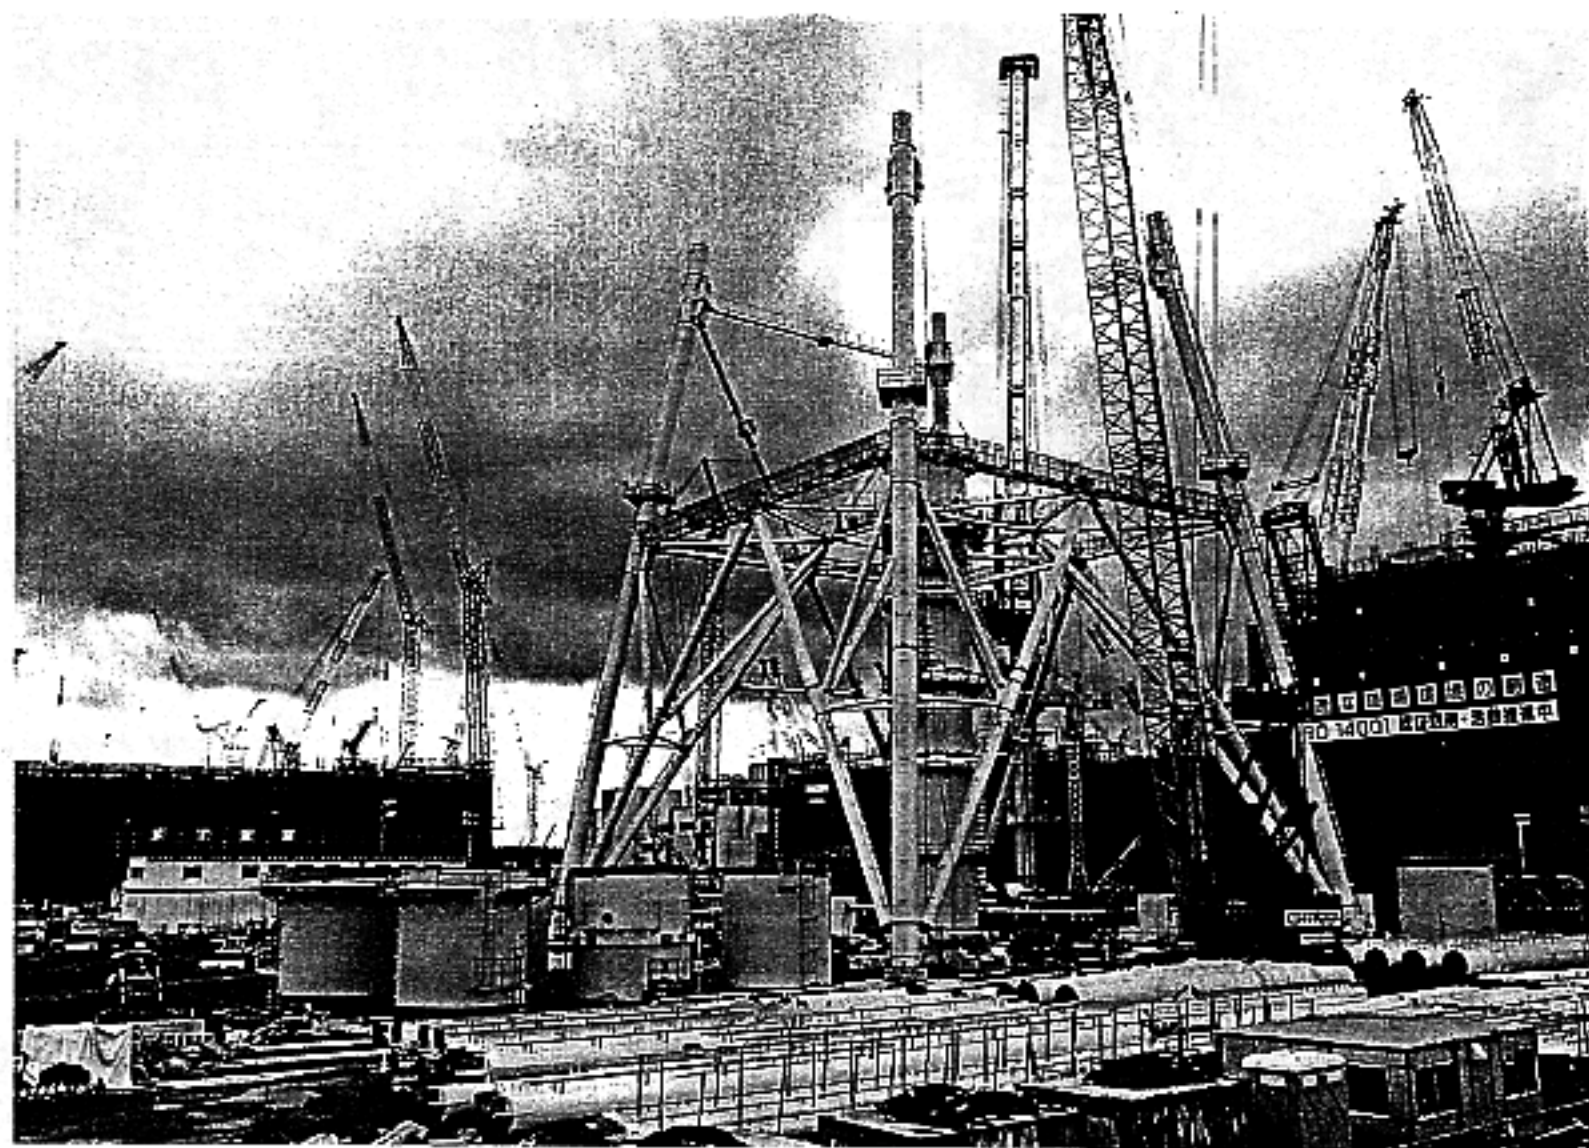

主排気筒工事状況


(平成12年10月30日 撮影)

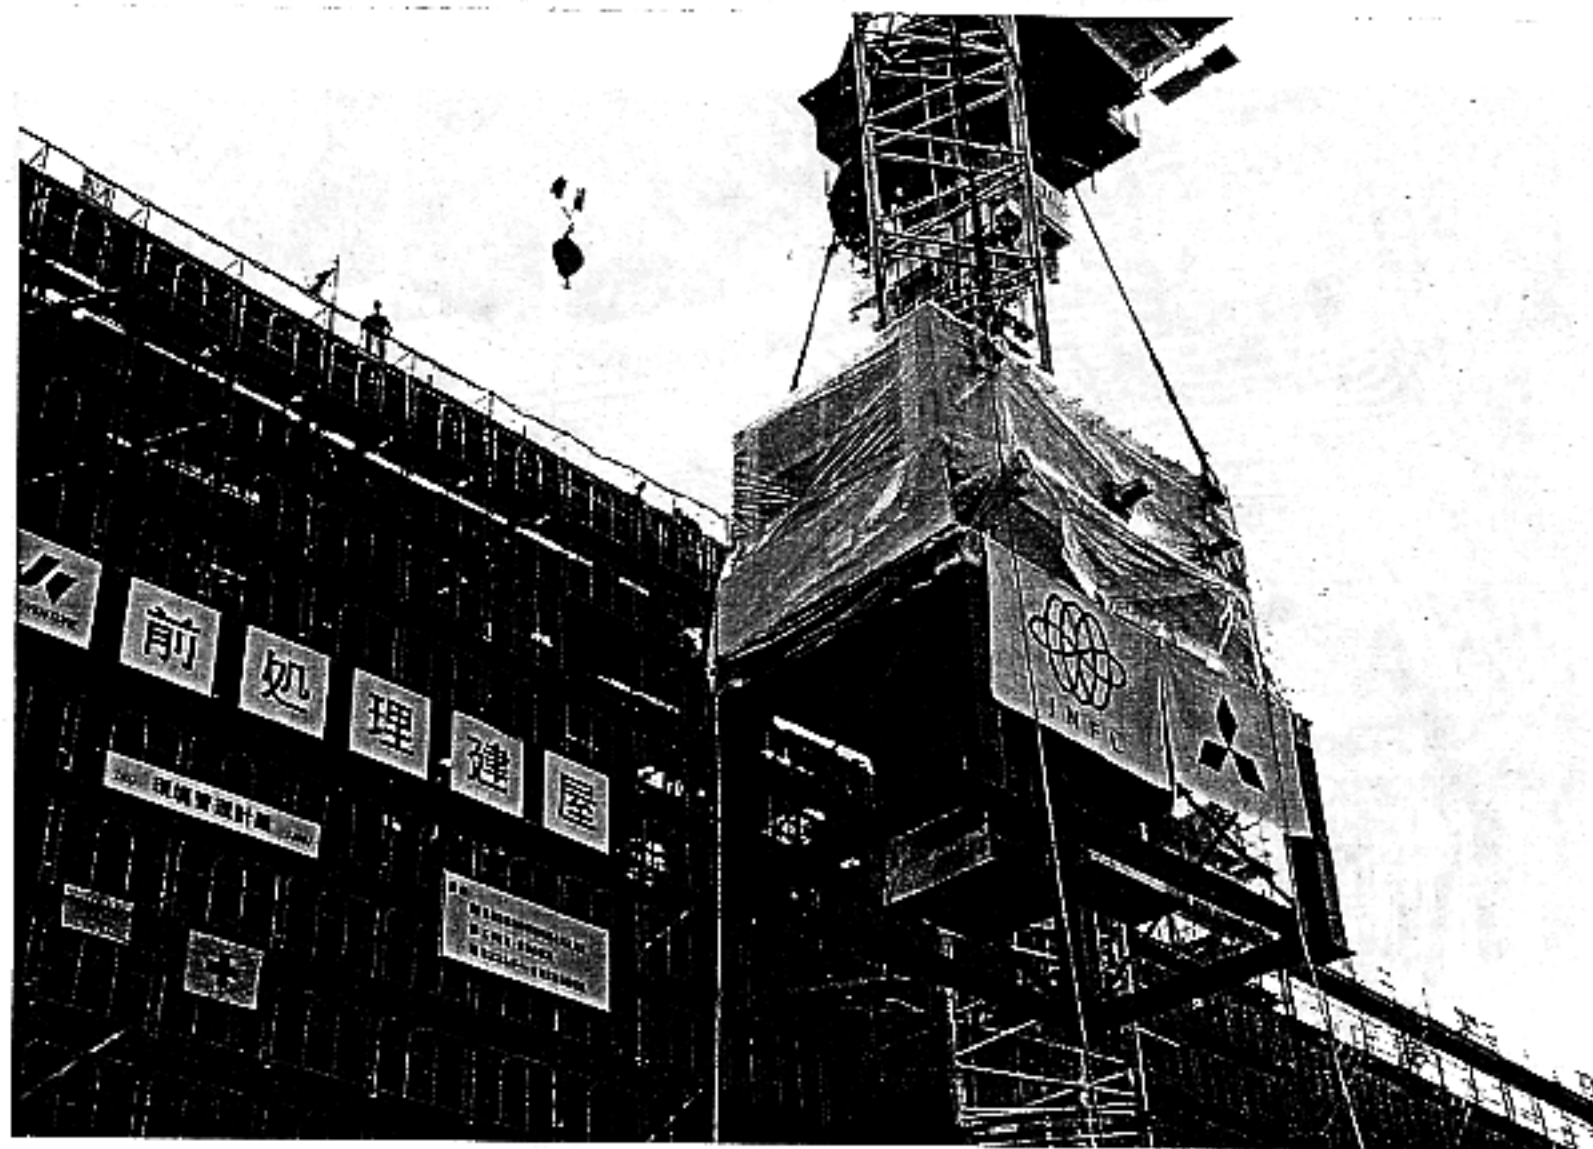

前処理建屋工事状況

【せん断機（本体部分）搬入作業状況】

（平成12年10月23日 撮影）

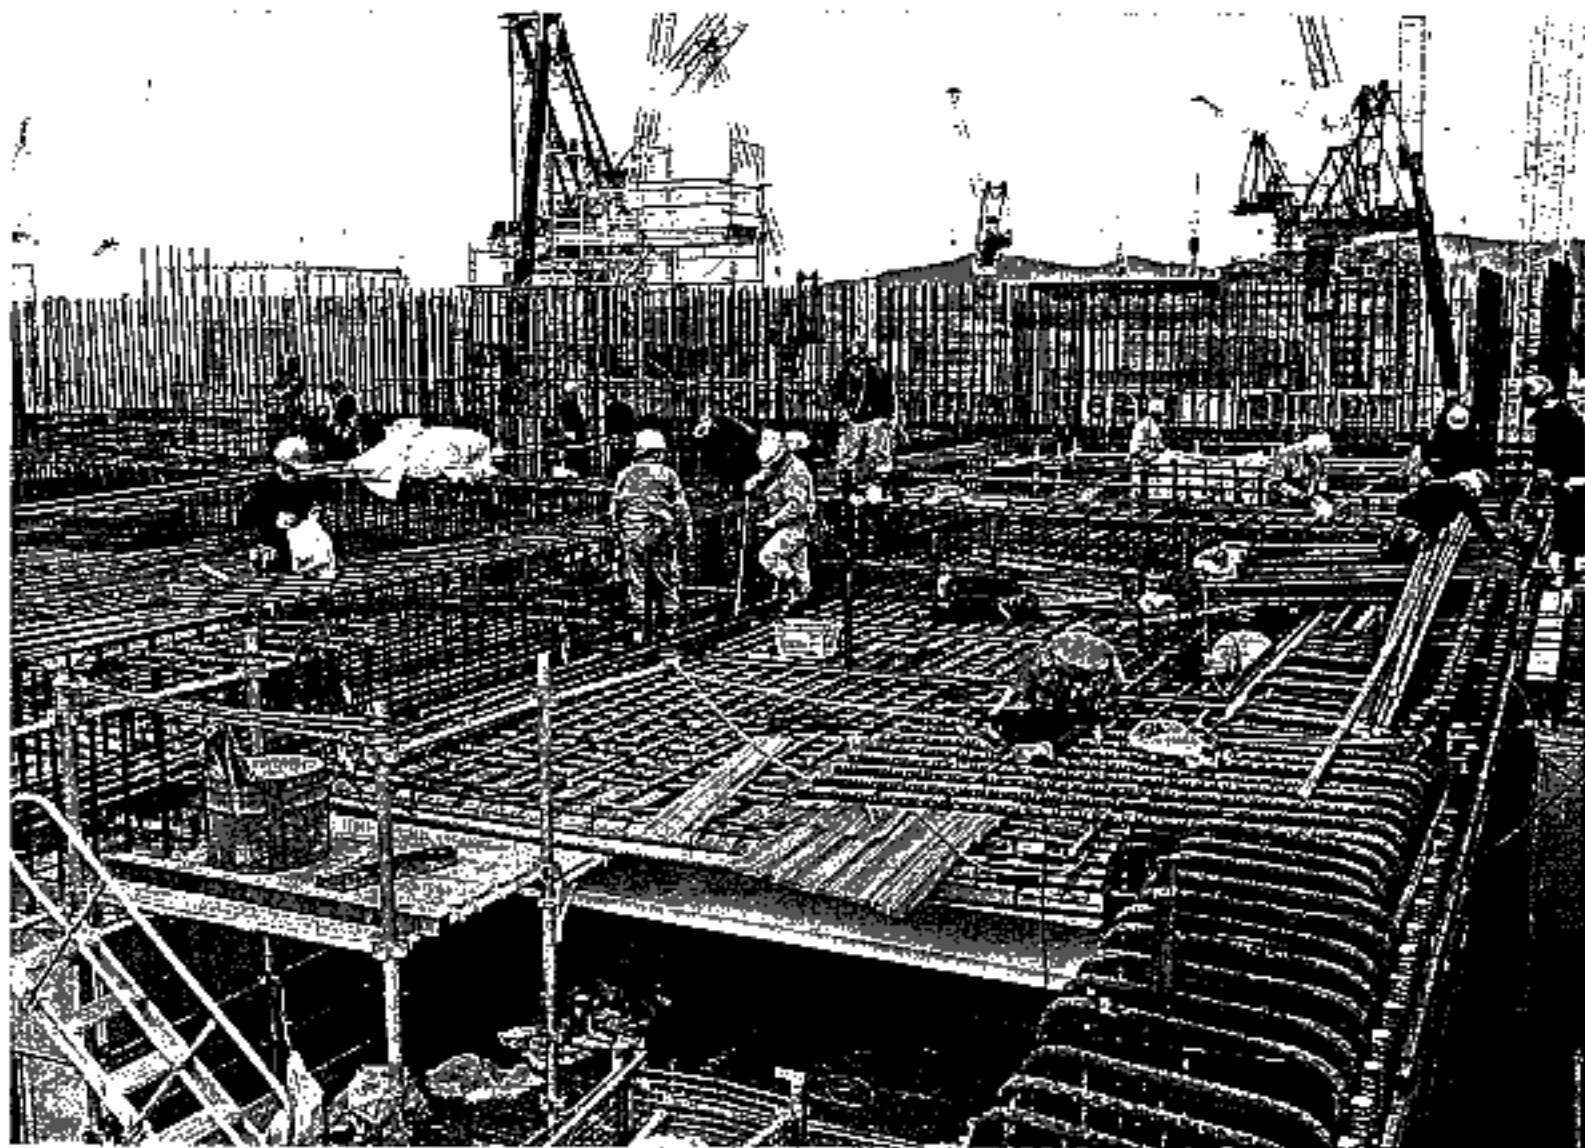

ウラン脱硝建屋工事状況

【地上5階建築作業状況】

(平成12年10月30日 撮影)

再処理設備本体等に係わる施設を対象とした 工事進捗率（想定）

年 月	10 年 度 末	11 年 度 末	12 年 度 末	13 年 度 末	14 年 度 末	17 年 7 月 （竣工時）
進 捗 率	13 %	37 %	60 %	80 %	90 %	100 %

（注 1） 10 年度末及び 11 年度末の進捗率は実績値。

（注 2） 上記進捗率と実績進捗率とは、工事の段取り調整や天候などによつて、±数%の相違は起こりうる。
